

## RÉTABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Cours d'eau : La Scie  
 Département : Seine-Maritime  
 Classement L214-17. L1-2 : Oui/Non

Ouvrage : La linerie  
 Commune : Crosville sur Scie  
 Ouvrage Grenelle : Oui / Non N° ROE : 106170 (106171, 13256)

Maître d'ouvrage : ASA de la Scie  
 Etude / Conception : ASA de la Scie / CG 76  
 Maître d'œuvre : ASA de la Scie  
 Entreprise : Environnement Forêts

Tel : 06.08.34.31.30  
 Tel : 02.76.51.70.02  
 Tel :  
 Tel : 03.23.74.30.29

Type d'aménagement :

- Renaturation
- Effacement de l'ouvrage
- Abaissement partiel
- Bras de contournement
- Equipement vannes ouvertes
- Equipement vannes fermées

Date de réalisation : 2018/2019


Caractéristiques de l'aménagement :

- Renaturation sur 106 ml (emprise du projet)
- 
- 
- 
- 

Objectifs principaux de l'aménagement :

1. Mise en conformité réglementaire
2. Atteinte du bon état écologique

Avant Aménagement

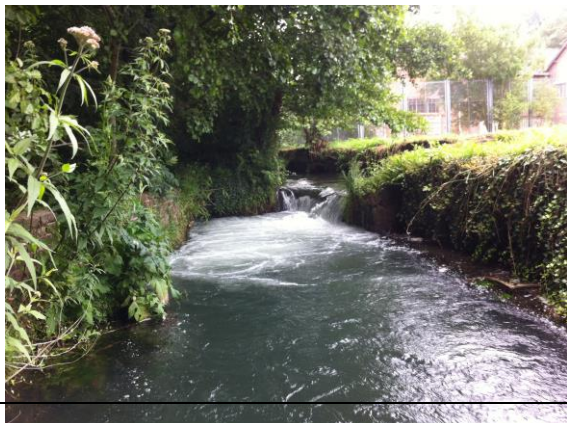

Après Aménagement



Droit d'eau ancien : -  
 Actualisation du droit d'eau : -

Dénivelée au droit d'eau : -  
 Dénivelée avant aménagement : 0.55 m  
 Dénivelée après aménagement : 0 m

Espèces migratrices cibles :

Anguille, Truite fario, Lamproie fluviatile, Truite de mer, Saumon atlantique

Coût des travaux : 67 439 € HT  
 Cout de Maitrise d'œuvre : 0 € TTC  
 Coût de l'aménagement (trav + Moe) : 67 439 € HT

Coût au mètre linéaire aménagé : 637 € HT/ml

Financement travaux :

80 %                      20 %                      %



Propriétaires

## Reportage photographique



Seuil avant travaux



Bief avant travaux



Terrassement du nouveau lit



Comblement du bief



Tracé du nouveau bras



Site après aménagement
